

# Dijkverbetering

## Merwededijk – Werkendam

Veilige dijken, veilig gevoel



Uitgevoerd door aannemerscombinatie  
Martens en Van Oord – De Klerk Merwededijk



## Nieuwsbrief

NUMMER 2 | OKTOBER 2013

### Wat vooraf ging

Eind augustus heeft u onze eerste nieuwsbrief ontvangen. Hierin hebben wij ons voorgesteld als aannemerscombinatie en een toelichting gegeven op zowel de inhoud van de werkzaamheden als hoe wij omgaan met het informeren van de omgeving. Tevens heeft u in deze nieuwsbrief de fasering van de werkzaamheden en onze contactgegevens getroffen.

### Het vervolg

Middels deze tweede nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de planning en aard van de werkzaamheden die de komende periode zullen worden uitgevoerd.

### Planning en aard van de werkzaamheden (buitendijks)

In onderstaand overzicht kunt u zien welke werkzaamheden wij wanneer uit gaan voeren:

- Week 43: Maaiwerkzaamheden buitentalud, frezen van het buitendijkse terrein en het verwijderen van buitendijkse afrastering;
- Week 43: Buitendijks ontgraven bovengrond ten behoeve van het nieuwe dijklichaam;
- Week 44: Aanvoer zand voor zandbed ten behoeve van drainagelaag voor het nieuwe buitendijkse dijklichaam;
- Week 45 t/m 47: Aanbrengen verticale drainage ten behoeve van het nieuwe buitendijkse dijklichaam;
- Week 47 t/m 06: Ontgraven Cloppenwaard en aanbrengen grond ten behoeve van het nieuwe buitendijkse dijklichaam (werkzaamheden afhankelijk van het waterpeil van de Merwede);
- Omstreeks 2<sup>e</sup> kwartaal 2015: Inrichten nieuw dijklichaam en aanbrengen damwand.

Bovengenoemde planning hebben wij zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Er bestaat echter de mogelijkheid dat de werkzaamheden sneller klaar zijn of mogelijk wat langer duren dan verwacht. Hiervoor vragen wij uw begrip.

### Hinder en overlast:

Alle genoemde werkzaamheden vinden buitendijks plaats. De te verwachten hinder en overlast voor bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden achten wij dus minimaal.

### Werkinrit en tijdelijke verkeersmaatregelen:

Tijdens de aanvoer van het benodigde zand (werkzaamheden week 44) maken wij gebruik van de loswal van de firma Dalm. Het zand wordt namelijk per schip aangevoerd. De wagens rijden het zand vanaf deze loswal (aan de Hoef) naar de Sleeuwijkse dijk alwaar we bij het Schwarzkopf-gebouw gebruik maken van de op- en afrit als werkin- en uitrit. De transporten vinden dus over slechts een korte afstand over de dijk plaats. Ter plaatse van de in- en uitritten bij Dalm en Schwarzkopf zetten wij verkeersregelaars is om de veiligheid te waarborgen.



Verder zullen er tijdens deze werkzaamheden tijdelijke verkeersmaatregelen worden getroffen. Deze maatregelen bestaan uit het reduceren van de snelheidslimiet op de dijk, en het attenderen op werkzaamheden in uitvoering en in- en uitvoegend werkverkeer. Hiervoor wordt bebording geplaatst.



#### ***Klachten, opmerkingen, vragen, meldingen, onveilige situaties:***

Uiteraard doen wij ons uiterste best om de werkzaamheden zo veilig mogelijk uit te voeren en zo min mogelijk hinder en overlast te veroorzaken. Ondanks dit streven kunnen zich mogelijk situaties voordoen waar u een klacht, opmerking of vraag over heeft, óf kunt u een onveilige situatie constateren.

Wij verzoeken u vriendelijk uw klachten, opmerkingen, vragen, meldingen, zorgen en onveilige situaties e.d. bij ons kenbaar te maken.

Op deze manier kunnen wij onze werkprocessen en de veiligheid op het werk verbeteren en hinder en overlast minimaliseren.

#### ***Inloospreekuur:***

Nu de werkzaamheden starten is er vanaf maandag 21 oktober aanstaande de mogelijkheid om gebruik te maken van het inloospreekuur. Het inloospreekuur vindt plaats op maandagen, tussen 16.00 uur en 18.30 uur. Hiervoor kunt u zich per telefoon of email aanmelden bij de Omgevingsmanager.

#### ***Volgende nieuwsbrief en informatiebijeenkomst***

De volgende nieuwsbrief verschijnt over twee maanden weer.


De volgende informatiebijeenkomst wordt binnenkort weer gepland. Hierover zal nog gecommuniceerd worden.

#### ***Bereikbaarheid van het werkgebied***

Wij zorgen ervoor dat er een continue bereikbaarheid is, zowel voor aanwonenden, het doorgaand verkeer als voor de nood- en hulpdiensten. Omdat de nieuwe dijk naast de bestaande dijk wordt aangelegd, zorgen we ervoor dat er altijd een doorgang is via één van de dijken.

#### ***Contact***

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Anita Ponsen (e-mail [aponssen@deklerkbv.nl](mailto:aponssen@deklerkbv.nl), tel. 0183 5086 66 of 06 20 735 509). Ook kunt u op de website <http://www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl/projecten/merwededijk> meer informatie vinden over het project.

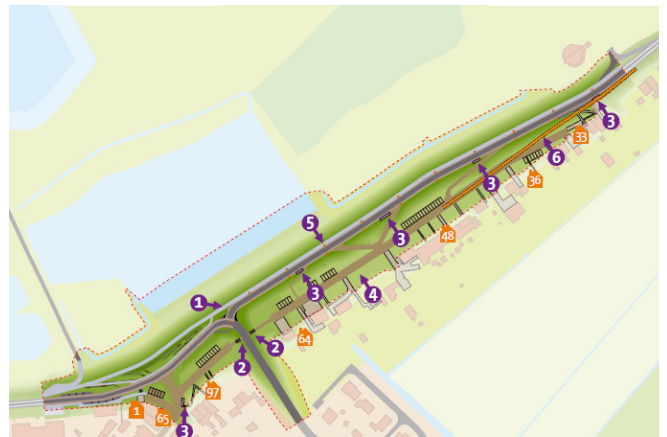

*Het project "Dijkverbetering Merwededijk te Werkendam" is een project binnen het HoogWaterBeschermingsProgramma van rijksoverheid.*

